




बागलुङ नगरपालिकाको आ.व. २०७५/०७६  
को वार्षिक कार्यप्रगति समिक्षा कार्यक्रम  
२९ भाद्र २०७६

बागलुङ नगर कार्यपालिकाको कार्यालय  
बागलुङ



# बागलुङ नगरपालिका

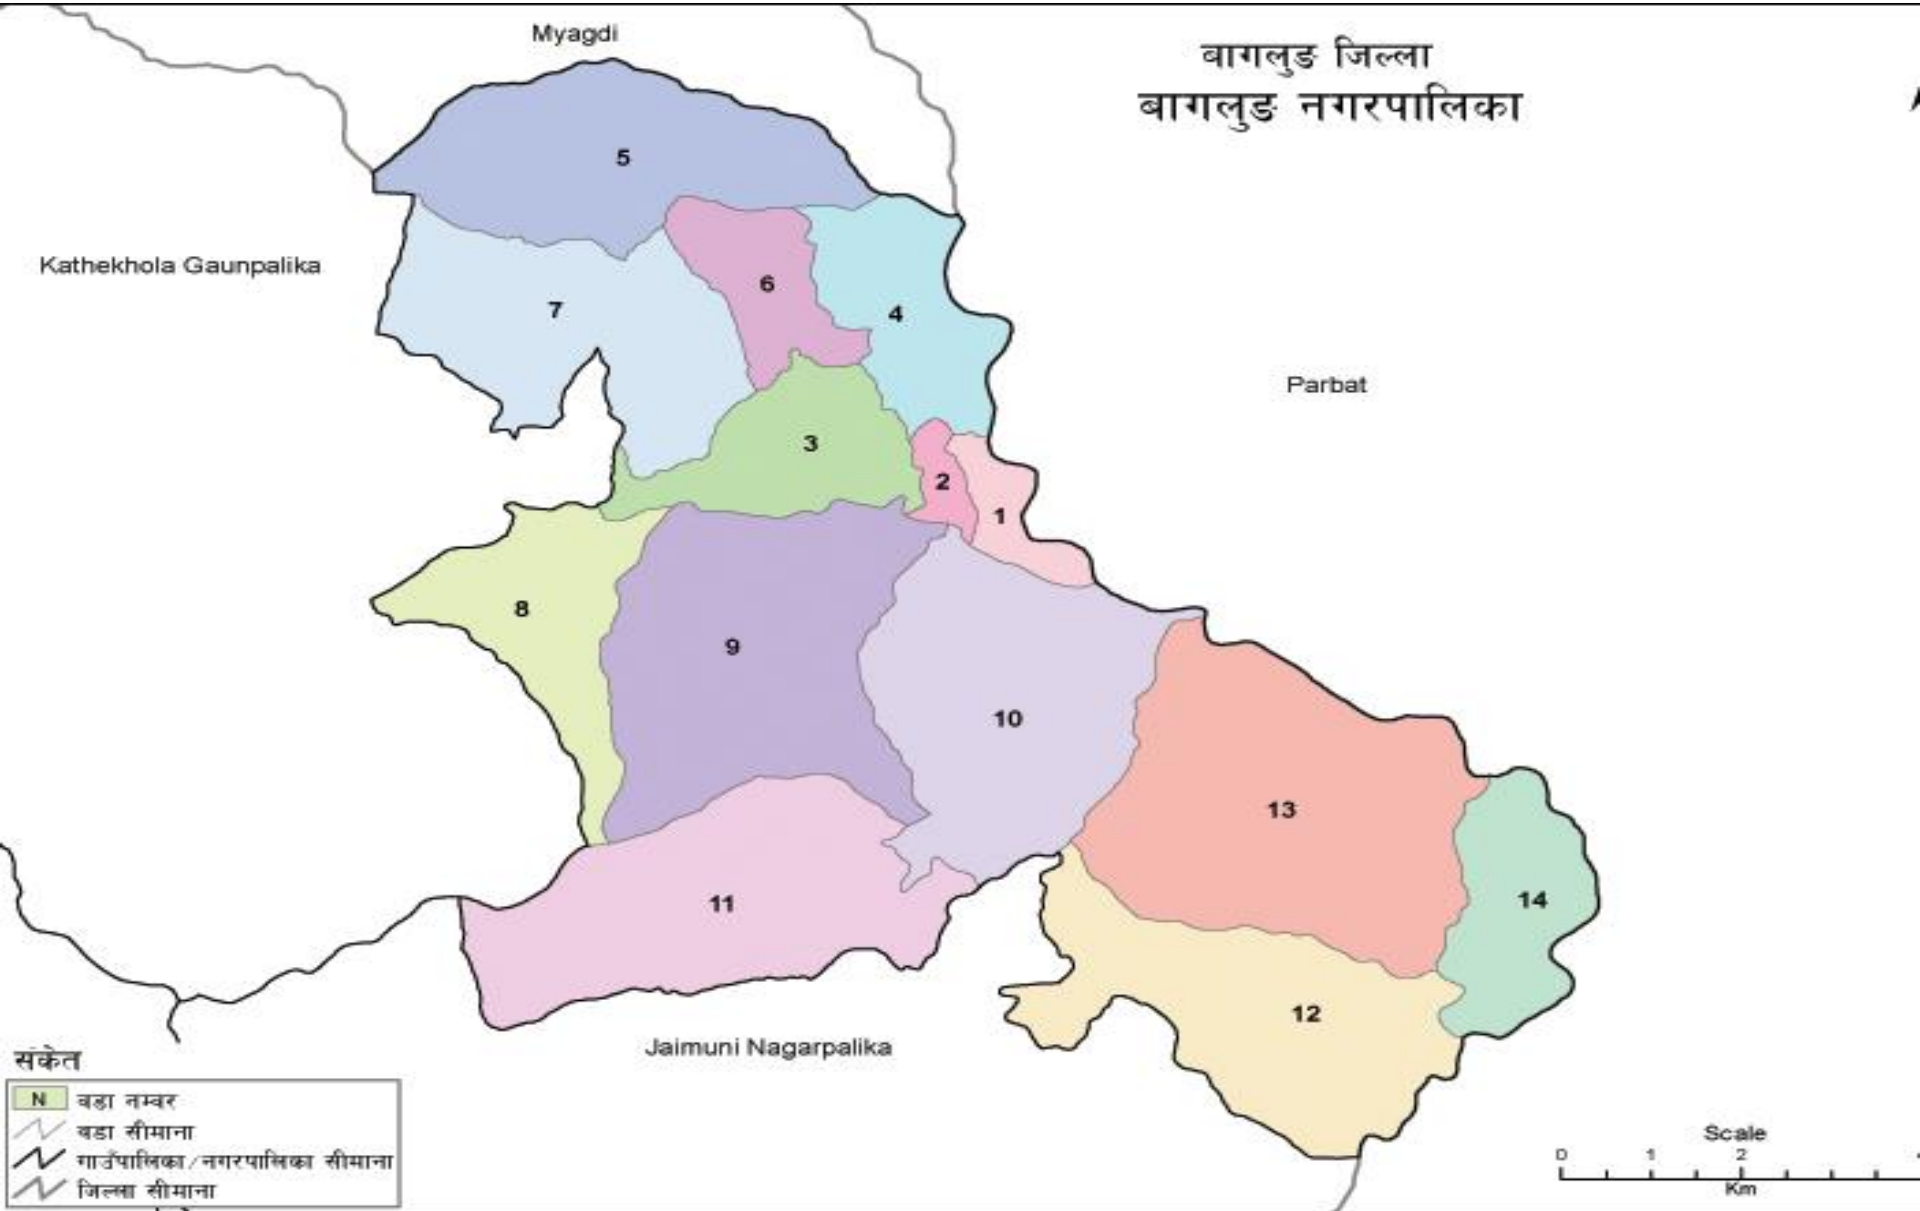



# वाग्लुङ नगरको सामान्य परिचय (आ.व. ०७५१०७६)

- कुल जनसंख्या : ५७,८२३ (२०६८)
- घरधुरी संख्या : १५,५१०
- महिला : ३१,३४३ + पुरुष : २६४८०
- परिवारको आकार : ३.८५
- साक्षरता सरदर : ८३.१५%
- महिला : ७३.०५ %
- पुरुष : ९३.२५ %.
- वडा संख्या : १४
- प्रदेश : गण्डकी प्रदेश
- क्षेत्रफल : ९८.०१ वर्ग किलोमिटर



# आ.व ०७५/०७६ को आय व्यायको अवस्था



शिर्षक	बजेट	खर्च रकम	खर्च (%)	बजेट बाँकी
चालु	५६,७४,८८,४००/-	५२,८३,६८,९६६.६५/-	९३.११%	३,९१,१९,४३३.३५/-
पूँजिगत	५३,९६,३३,४९४/-	३२,३२,११,१४२.२७/-	५९.९०%	२१,६४,२२,३५१.७३/-
जम्मा	१,१०,७१,२१,८९४/-	८५,१५,८०,१०८.९२/-	७६.९२%	२५,५५,४१,७८५.०८/-



# आम्दानीको विवरण



क्र.सं.	विवरण	संशोधित अनुमान	प्राप्ति
	१ वित्तीय समानीकरण अनुदान		
१.१	संघ	१५६६०००००	१५६६०००००
१.२	प्रदेश	१२९९००००	११६१२८९९.६
	२ सशर्त अनुदान	३६४२५९०००	३६०४६४०००
	३ सामाजिक सुरक्षा	११६८९५०००	११६८९५०००
	४ पर्यटन पूर्वाधार सशर्त	५८०००००	५८०००००
	५ संस्कृति प्रवर्धन सशर्त	६००००००	६००००००
	६ गरिवसंग विश्वेश्वर	३९४०००	३९४०००
	७ प्रधानमन्त्री रोजगार	६७६४०००	६७५३४५८
	८ एल जि सि डि पि	२२८०००	२२८०००
	९ स्थानिय स्तरका सडकपुल	१७०००००	०
१०	कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन	४००००००	२६४९९८४
११	स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी	९९५००००	९९५००००
१२	पूर्वाधार कार्यालय पर्वत	६००००००	५७३४४००
१३	सर्वसिद्धधाम पञ्चकोट प्रदेश	२००००००	२००००००
१४	समपुरक कोष प्रदेश	१०००००००	२५०००००
१५	स्वास्थ्य संस्था उपकरण	७०००००	७०००००
१६	विशेष अनुदान	३६९०६०००	१०००००००



## कुल बजेट खर्च



सि.नं.	वजेट	विनियोजित बजेट	खर्च	खर्च प्रतिशत	बाँकी बजेट
१	बागलुङ नगरपालिका प्रशासनिक	२२२३५३४००.००	२०१९३२७२२.६८	९०.८२	२०४२०६७७.३२
२	बा.न.पा. नगरस्तरीय योजना	२५२०५००००.००	१४२७६०६९६.६४	५६.६४	१०९२८९३०३.३६
३	बा.न.पा. वडास्तरीय योजना	७०००००००.००	६३३०६७९७.	९०.४४	६६९३२०३.००
४	क्रमागत तथा दायित्व बाँकी योजना	८६३९६८६६.००	३९३७०९८८.	४५.५७	४७०२५८७८.००
५	नगर विकास कोष कार्यक्रम	१००८६५६२८.००	२३०३९२४९.७६	२२.८४	७७८२६३७८.२४
६	सडक बोर्ड कार्यक्रम	५५७१०००.००	९९८७७०.	१७.९३	४५७२२३०.००
७	प्रदेश समपुरक योजना	१०००००००.००	२५०००००.	२५.००	७५०००००.००
८	स्वास्थ्य संस्था औजार उपकरण खरिद	७०००००.००	६९५४५४.६	९९.३५	४५४५.४०
९	सर्वसिद्धधाम पञ्चकोट	२००००००.००	१९१४५६०.	९५.७३	८५४४०.००
१०	पुर्वाधार कार्यालय पर्वतमार्फतका योजना	६००००००.००	५४०५५२१.	९०.०९	५९४४७९.००
११	प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम	६७६४०००.००	४९७६६७०.७३	७३.५८	१७८७३२९.२७
१२	एल जि सि डि पि	२२८०००.००	२१९५१०.	९६.२८	८४९०.००
१३	गरिवसंग विश्वेश्वर	३९४०००.००	३६६०००.	९२.८९	२८०००.००
१४	विशेष अनुदान	३६९०६०००.००	४५८५७६६.७	१२.४३	३२३२०२३३.३०
१५	संस्कृति प्रवर्द्धन कार्यक्रम	६००००००.००	५८१७२१२.	९६.९५	१८२७८८.००
१६	स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी	९९५००००.००	८३९९४०३.६५	८४.४२	१५५०५९६.३५
१७	पर्यटन पूर्वाधार विकास	५८०००००.००	५५२५५०७.	९५.२७	२७४४९३.००
१८	कृषि व्यवसाय/वजार विकास	४००००००.००	२६४९९८४.	६६.२५	१३५००१६.००
१९	स्थानीय स्तरका सडकपुल	१७०००००.००	०.	०.००	१७०००००.००
२०	संघ सशर्त	३६४२५९०००.००	३३७११५२९५.१६	९२.५५	२७१४३७०४.८४
जम्मा		१,१०,७१,२१,८९४	८५१५८०१०८.९२	७६.९२	२५,५५,४१,७८५.०८



## कुल चालु वजेट खर्च



सि.नं.	वजेट	विनियोजित बजेट	खर्च	खर्च प्रतिशत	वाँकी बजेट
१	बागलुङ नगरपालिका प्रशासनिक	९०७०८४००.	८१७८११४०.९८	९०.१६	८९,२७,२५९.०२
२	जेष्ठ नागरिक दीर्घ सेवा सम्मान तथा सामाजिक सुरक्षा	११६८९५०००.	१०८,३०१,४००.००	९२.६५	८५,९३,६००.००
३	संघ सशर्त चालु	३४९४६९०००	३३११५५६४२.२	९४.७६	१८३१३३५७.८
४	एल जि सि डि पि	२२८०००	२१९५१०	९६.२८	८४९०
५	गरिवसंग विश्वेश्वर	१९४०००.००	१६६०००.	८५.५७	२८०००.००
६	प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम	६७६४०००.००	४९७६६७०.७३	७३.५८	१७,७६,७८७.२७
७	विशेष अनुदान	३२३००००.००	१७६८६०२.७८	५४.७६	१४,६१,३९७.२२
जम्मा		५६७४८८४००.००	५२८३६८९६६.६५	९३.११	३९११९४३३.३५



## कुल पूँजीगत वजेट खर्च



१	बागलुङ नगरपालिका प्रशासनिक	१४७५००००.००	११८५०१८१.७	८०.३४	२८९९८१८.३०
२	बा.न.पा. नगरस्तरीय योजना	२५२०५००००.००	१४२७६०६९६.६४	५६.६४	१०९२८९३०३.३६
३	बा.न.पा. वडास्तरीय योजना	७०००००००.००	६३३०६७९७.०	९०.४४	६६९३२०३.००
४	क्रमागत तथा दायित्व बाँकी योजना	८६३९६८६६.००	३९३७०९८८.०	४५.५७	४७०२५८७८.००
५	नगर विकास कोष कार्यक्रम	१००८६५६२८.००	२३०३९२४९.७६	२२.८४	७७८२६३७८.२४
६	सडक बोर्ड कार्यक्रम	५५७१०००.००	९९८७७०.०	१७.९३	४५७२२३०.००
७	प्रदेश समपुरक योजना	१०००००००.००	२५०००००.०	२५.००	७५०००००.००
८	स्वास्थ्य संस्था औजार उपकरण खरिद	७०००००.००	६९५४५४.६	९९.३५	४५४५.४०
९	सर्वसिद्धधाम पञ्चकोट	२००००००.००	१९१४५६०.०	९५.७३	८५४४०.००
१०	पुर्वाधार कार्यालय पर्वतमार्फतका योज	६००००००.००	५४०५५२१.०	९०.०९	५९४४७९.००
११	गरिवसंग विश्वेश्वर	२०००००.००	२०००००.०	१००.००	०.००
१२	विशेष अनुदान	३३६७६०००.००	२८१७१६३.९२	८.३७	३०८५८८३६.०८
१३	संस्कृति प्रवर्द्धन कार्यक्रम	६००००००.००	५८१७२१२.०	९६.९५	१८२७८८.००
१४	स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी	९९५००००.००	८३९९४०३.६५	८४.४२	१५५०५९६.३५
१५	पर्यटन पूर्वाधार विकास	५८०००००.००	५५२५५०७.०	९५.२७	२७४४९३.००
१६	कृषि व्यवसाय/वजार विकास	४००००००.००	२६४९९८४.०	६६.२५	१३५००१६.००
१७	स्थानीय स्तरका सडकपुल	१७०००००.००	०.०	०.००	१७०००००.००
१८	संघ सशर्त पूँजीगत	१४७९००००.००	५९५९६५३.०	४०.३०	८८३०३४७.००
जम्मा		५३,९६,३३,४९४	३२३२१११४२.२७	५९.९०	२१,६४,२२,३५१.७३



# राजश्व आमदानी सम्बन्धि विवरण

---

# बागलुङ नगरपालिका

## नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

शिर्षक अनुसार आ.व. ०७४।०७५ को अनुमान र यथार्थ आय, आ.व. ०७५।०७६ को अनुमानित आय र आ.व. ०७५।०७६ को यथार्थ आय र आ.व. ०७६।०७७ को अनुमानित आय

क्र.सं.	विवरण	०७४।०७५ को अनुमानित आय	०७४।०७५ को यथार्थ आय	०७५।०७६ को अनुमानित आय	०७५।०७६ को यथार्थ आय	अनुमान भन्दा घटी/बढी	०७६।०७७ को अनुमानित आय
1	सम्पत्ति कर तथा भूमिकर	5,500,000.00	6,187,965.61	11,000,000.00	6,873,481.50	-४,१२६,५१८.५०	9,000,000.00
2	अचल सम्पत्ती मूल्यांकन शुल्क	1,200,000.00	1,260,726.00	1,700,000.00	1,756,705.00	५६,७०५.००	2,350,000.00
3	पार्किङ शुल्क			700,000.00	34,805.00	-६६५,१९५.००	
4	घर नक्सा पास दस्तुर	3,100,000.00	3,732,452.32	5,000,000.00	3,548,772.78	-१,४५१,२२७.२२	6,500,000.00
5	दण्ड जरीवाना	3,800.00	3,900.00	900,000.00	101,400.00	-७९६,६००.००	50,000.00
6	बिठौरी कर			700,000.00	13,600.00	-६८६,४००.००	150,000.00
7	नक्सा पास फारम	170,000.00	170,000.00	450,000.00	150,000.00	-३००,०००.००	100,000.00
8	नाता प्रमाणित	37,200.00	40,100.00	150,000.00	186,600.00	३६,६००.००	150,000.00
9	पञ्जिकरण	120,000.00	125,850.00	150,000.00	128,990.00	-२१,०१०.००	100,000.00
10	सडक सेवा शुल्क	18,500.00	18,500.00		139,252.00	१३९,२५२.००	
11	बहाल कर	1,100,000.00	1,404,331.35	15,900,000.00	9,063,847.37	-६,८३६,१५२.६३	7,500,000.00
12	बिज्ञापन कर	656,151.00	656,151.00	1,050,000.00	10,250.00	-१,०३९,७५०.००	800,000.00
13	मनोरञ्जन कर	9,235.00	9,235.00	195,000.00	0.00	-१९५,०००.००	25,000.00
14	व्यवसाय कर	4,300,000.00	4,908,990.00	7,000,000.00	5,810,185.00	-१,१८९,८१५.००	9,000,000.00
15	विविध आय	53,840.00	16,665.00	350,000.00	85,915.00	-२६४,०८५.००	200,000.00
16	सवारी कर	370,600.00	398,100.00	460,000.00	64,850.00	-३९५,१५०.००	
17	सडक मर्मतसेवा शुल्क			600,000.00	103,050.00	-४९६,९५०.००	150,000.00
18	सिफारिस दस्तुर	4,300,000.00	4,817,701.00	6,500,000.00	3,644,486.00	-२,८५५,५१४.००	5,300,000.00
19	घर न.स.स. शुल्क	200,000.00	175,750.00	700,000.00	2,000.00	-६९६,०००.००	800,000.00
20	लिलाम		45,500.00		114,000.00	११४,०००.००	
21	मालपोत	248,904.00	477,542.02	50,000.00	135,814.00	८५,८१४.००	20,000.00
22	नक्सा सुचिकृत दस्तुर	200,000.00	208,000.00	450,000.00	208,000.00	-२४२,०००.००	100,000.00
23	गिठी बालुवा र निकासी कर			5,000,000.00	4,306,010.00	-६९३,९९०.००	6,250,000.00
24	कवाडी कर	528,520.00	528,520.00	820,000.00	808,000.00	-१२,०००.००	905,000.00
25	गत वर्षको बेरुजु जम्मा	83,250.00	83,250.00	175,000.00	78,004.00	-९६,९९६.००	150,000.00
26	बसपार्क व्यवस्थापन शुल्क				300,001.00	३००,००१.००	400,000.00
	<b>जम्मा</b>	<b>22,200,000.00</b>	<b>25,269,229.30</b>	<b>60,000,000.00</b>	<b>37,668,018.65</b>	<b>-२२,३३१,९८१.३५</b>	<b>५०,०००,०००.००</b>



# विकास आयोजना सम्बन्धि प्रस्तुति



# योजना कार्यन्वयनको अवस्था



- कुल योजना संख्या : ६४१
  
- वडा स्तरीय योजना संख्या : ३४९
- नगर स्तरीय योजना संख्या : २३४
- सशर्त तर्फका योजना संख्या : ५८  
(संघ, प्रदेश र अन्य गरी)
- जम्मा योजना संख्या : ६४१



# योजना कार्यन्वयनको अवस्था



➤ जम्मा योजना संख्या :	६४१	१००
➤ संभौता योजना संख्या :	५८७	९१.५७%
➤ फरफारक संख्या :	५७१	८९.०७%
➤ फरफारक हुन बाँकी :	१६	२.६५%
➤ संभौता नभएका :	५४	८.२६%



# वडा स्तरिय योजनाको अवस्था



- जम्मा योजना संख्या : ३४९
- संभौता भएका योजना संख्या : ३३७
- फरफारक योजना संख्या : ३२४
- संभौता भै फरफारक नभएका संख्या : १३
- संभौता नभएका योजना संख्या : १२



# सडक तर्फको भौतिक उपलब्धि



क्र.स.	विवरण	इकाई		खर्च रकम	ला.जनसंख्या.
१	नया ट्याक ओपन	कि.मी	३०१५७०	१०६,०५,४६,३६	६६४००६
२	ग्राभेल	मि.	०१९८७		
३	ढलान	कि. मी	३१९७५		
४	कालो पत्रे	कि.मी	११२७१		
५	मर्मत/स्तरोन्नती	कि.मी	६६१४८१		
६	जाली /ग्यावियन	मि.	९२३		
७	पक्की नाली	कि.मी	४१०८९		
८	कच्ची नाली	कि.मी	७०००		
९	अन्यमा मेशिनरी वाल	कि.मी	०१४२७		
१०	घोडेटो बाटो (गोटा)	गोटा	३३		
११	घोडेटो बाटो	कि.मि.	६१३२८		
१२	गोरेटो बाटो	कि.मि.	११७१३		
१३	बाटो सिडी	मि.	६५		



# खानेपानी तर्फको भौतिक उपलब्धि



क्र.स.	विवरण	इकाई	परिणम	खर्च रकम	ला.जनसंख्या.
१	खानेपानी योजना संख्या	गोटा	४२	१,२२,१२,३४३	८६३३ जना
२	टेकी	गोटा	३२		
३	च्याम्बर/भल्व च्याम्बर	गोटा	११७		
४	धारा	गोटा	१०८४		
५	पाइप लाईन	किमि.	७९।६५०		
६	रिजरभ टेंकी	गोटा	१७		
७	कलेक्सन च्याम्बर	गोटा	३		
८	सेक्सन भल्व बक्स	गोटा	१००		
९	डिस्ट्रिभिसन च्याम्बर	गोटा	२		
११	<b>interruprion chamber</b>	गोटा	१		
१२	एकरं बल्क	गोटा	५०		
१३	प्रोटेक्सन वाल तथा सेफटी गार्ड	गोटा	२		
१४	पोखरी	गोटा	३		
१५	इन्टेक	गोटा	२८		
१६	मूहान टेंकी/इन्टेक	गोटा	४२		
१७	अन्य (इलेक्ट्रोमेकाकिल पम्पीड)	गाटा	३		





# सिचाई तर्फको भौतिक प्रगति



क्र.स.	विवरण	इकाई	परिणाम	खर्च रकम	ला.जनसंख्या
१	संख्या	गोटा/कि.मि	२९	२२,२३,११७	५५६७
२	पक्की क्यानल	कि.मि	०१४७		
३	पाइप लाईन	कि. मि	४४१२		
४	इन्टेक	गोटा	३		
५	च्याम्बर/भल्वच्याम्बर		१२		
६	पोखरी	गोटा	१२		
७	अन्य	हेक्टर	५		



# भवन तर्फको भौतिक प्रगति



क्र.स	विवरण	इकाई	परिणाम	खर्च रकम	ला.जनसंख्या
१	सामूदायीक भवन निर्माण र मर्मत	गोटा	२३	३,६६,२४,५९८।	१०९८६
२	वडा कार्यालय भवन मर्मत	गोटा	८		
३	क्रियापूत्री भवन निर्माण र मर्मत	गाटा	३		
४	विद्यालय भवन मर्मत	गोटा	११		
५	विद्यालय भवन निर्माटा	गोटा	३		
६	वालविकास केन्द्र भवन निर्माण	गोटा	६		
७	विद्यालय फर्चिचर खरिद	गोटा	५		
८	मठमन्दिर	गोटा	२८		
९	विद्यालय तारवार र फर्निचर	मि.	१०२		
१०	अन्य(पत्रकार र स्वास्थ्य) भवन	गोटा	३		



# खेलमैदान तर्फको भौतिक प्रगति



क्र.स	विवरण	इकाई	परिणम	खर्च रकम	ला.जनसंख्या
१	फूटवल ग्राउण्ड	गोटा	२३	७१,९४,२३३।	७४६३
२	स्कूल ग्राउण्ड	गोटा	५		
३	तारवार	मि.	१३६।१०		
४	अन्य (खेलकुद सामाग्री वितरण)	गोटा	१३		



# विद्युत,पोल र अन्य



क्र.स	विवरण	इकाई	परिणाम	खर्च रकम	ला.जनसंख्या
१	विद्युत	गोटा		५४५५००	११००
२	विद्युत पोल	गोटा		७४२७०	३५२
३	पार्क	गोटा	२		
४	फोहोर मैला व्यास्थापन	गोटा	१		
४	सार्वजनिक शौचालय	गोटा	१०		
५	पर्यटन (होमस्टे,शहरी सौन्दर्य आदी)	गोटा	३		
६	शैक्षिक सूधार (स्कूल बस खरिद)	गोटा	१		
७	वन्यजन्तु सरक्षण	गोटा	१		
८	विपद व्यवस्थापन	गोटा	१४		
९	आरन सूधार	गोटा	२		
१०	स्वास्थ्य (डिफ्रीज,स्ट्रेचर,औषधी खरिद)	गोटा	३		
११	गेट	गेटा	३		
१३	अन्य	गोटा	१३		
				२,७८,५६,०१६।	३२०००



# बसपार्क निर्माण तर्फ



- ❖ कुल लागत रु १०,४६,००,०००।-
- ❖ संभौता रकम : ७,६६,९९,०७४।५४
- ❖ नगर विकास कोषबाट प्राप्त : २,५९,७८,४५०।७६
- ✘ ऋण : २,३९,८०,१०८।४०
- ✘ अनुदान : १९,९८,३४२।३६
  
- ❖ कुल खर्च रु : २,६६,४४,५६४।९०
- ✘ ऋण : २,३९,८०,१०८।४०
- ✘ अनुदान : १९,९८,३४२।३६
- ✘ न.पा.सहभागिता : ६,६६,११४।१२
- ❖ वित्तीय प्रगति : २३ प्रतिशत
- ❖ भौतिक प्रगति : २१.५१ प्रतिशत



# टेण्डर मार्फत संचालित योजनाहरू



सि.नं	आयोजनाको नाम	कुल लगत (संभौता)	खर्च रकम	उपलब्धी	वित्तिय प्रगति	भैतिक प्रगति
1	देउरालीचोक खहरे चाँपवोट नुवारा सडक	४१,९७,०६९।५०	११,४९१२६।३०	सडकस्तर वृद्धि ४०० मि. पक्की नाली निर्माण २३० मि. सडक कालो पत्रे ४०० मि. ग्याभियन जाली ११.५० घ.मि. मेशिनरी वाल ३४.५६ घ.मि.	27 %	114%
2	५ नं. वडा कार्यालयदेखि भान्सा वलस्वारा सडक	५०,७२,४६०।५५	४९,६७,३८१।५८	सडकस्तर वृद्धि १००० मि. पक्की नाली निर्माण ३१० मि. सडक ढलान ९५ मि. सडक कालो पत्रे २९५ मि. ग्याभियन जाली ४४ घ.मि. मेशिनरी वाल १९.१६ घ.मि.	98%	99%
3	वुकेनी मनकामना डिहिडाँडा सडक	४९,०५,१८५।९७	८,६३०००	सडक स्तरवृद्धि १.५ कि.मि.	18%	30%
4	जल्केनी काभ्रेडाँडा भैरवस्थान सडक	४४,१७,०३५।९७	२८,५१,८८४।१०	सडकस्तर वृद्धि २.५ कि. मि. ग्याभियन जाली १८९ घ.मि. मेशिनरी वाल ९० घ.मि.	65%	80%



# टेण्डर मार्फत संचालित योजनाहरू



सि.नं	आयोजनाको नाम	कुल लगत	खर्च रकम	उपलब्धी	वित्तिय प्रगति	भैतिक प्रगति
5	पानीटेकी पैयुपाटा सडक	३३,३८,९४७।९२	२७,५९,२०४।९०	सडकस्तर वृद्धि ३०० मि. पक्की नाली निर्माण २५० मि. सडक ढलान ५० मि. सडक कालोपत्रे ९७५ मि. स्याभियन जाली ५५ घ.मि.. मेशिनरी वाल २२.०४ घ.मि.	82%	89%
6	पानी टेकी एयरपोर्ट सडक	३३,८९,६७३।३९	९०,९३,९२४	सडकस्तर वृद्धि ३५० मि. पक्की नाली निर्माण ३५० मि. सडक कालोपत्रे ३४५ मि. स्मेशिनरी वाल ८.०० घ.मि.	32%	100%
7	गलुवा भकुण्डे फलाँटे सडक	५५,९९,७३९।८०	५३,४८,२३६।६०	सडकस्तर वृद्धि २.५ कि.मि. सडक ढलान ९६५ मि. ग्याभियन जाली ८४ घ.मि. मेशिनरी वाल ९५६.घ.मि.	97%	98%
8	भकुण्डे रायडाँडा सडक	३६,९५,९८७।६२	३४,५८,२३६।६३	सडकस्तर वृद्धि ९.९ कि.मि. सडक ढलान ९० मि. ग्याभियनजाली ७७.५० घ.मि. मेशिनरी वाल ६३.५० घ.मि.	96%	96%

# टेण्डर माफेत संचालित योजनाहरू



सि.नं	आयोजनाको नाम	कुल लगत	खर्च रकम	उपलब्धी	वित्तिय प्रगति	भैतिक प्रगति
9	अदालत चौपारी तित्याङ्ग सालवोट सिमलपाटा भकुण्डठे रायडाँडा सडक (पहिलो प्याकेज)	७५,७४,०३१।	७५,७१,९१२।४१	सडकस्तर वृद्धि ५.२५४ कि.मि. पक्कीनाली निर्माण ८०० मि. ग्याभियन जाली ४५ घ.मि.. मेशिनरी वाल २८० घ.मि.	99.9 %	99%
10	सिमदेखि कालीमाटी पैरावारी सडक	२,१३,०१,८७५।०५	७७१६०४०।५८	सडकस्तर वृद्धि २.०० कि.मि. सडक ढलान २१० मि. सडक कालोपत्रे १७५ मि. ग्याभियन जाली २५६ घ.मि.. मेशिनरी वाल १०१ घ.मि.	36%	30%
11	वागलुङ हेडक्वाटर सिगाना चापाखर्क गाजा दह वागगोटे हुँदै वरेङ सडक	२७,७२,०६०।८३	२७,२१,४३५।१७	सडकस्तर वृद्धि १६९ मि. सडक ढलान १६९ मि.	98%	98%
12	अदालत चौपारी तित्याङ्ग सालवोट सिमलपाटा भकुण्डठे रायडाँडा सडक (दोश्रो प्याकेज)	३३,३३,८८५।७२	१९,२०,९३६।६४	सडकस्तर वृद्धि ५.३ कि.मि	58%	55%
13	वसपार्क निर्माण	७,६६,९९,०७४।५४	२,६६,४४,५६४।९०	टर्मिनल भवनको फ्रेम बनेको रिटेनिङ वाल ७०० घ.मि. व्यवसायिक भवनको फउण्डेशन निर्माण	23%	21.51 %





# टेण्डरबाट गरिएका कार्यको उपलब्धि मापन



क्र.स	विवरण	इकाई	परिणाम		
१	सडकस्तर वृद्धि	कि.मि.	२३.२१९		
२	पक्की नाली निर्माण	कि.मि.	१.९४०		
३	सडक ढलान	कि.मि.	०.७७९		
४	सडक कालोपत्रे	कि.मि.	१.२१५		
४	ग्याभियन जाली भर्ने	घ.मि.	७६२		
५	मेशिनरी वाल निर्माण	घ.मि.	७७३.१६		



# डी.पी.आर. भएका सडकहरुको विवरण



सि.न.	डी.पी.आर. भएका सडक	कुल लागत	कुल लम्बाई	लागत प्रति के.मि.
१	देउराली चोक खहरे सडक	१६२३२२५५८८२	४१२७५	३७९७०१८९।२०
२	मौरेस्वारा धजाहालिन ठाटिबान्द्रे ठुलखोला सडक	४२२४२६३१४।२४	११।७०५	३६०८९३९०।३७
३	वुकेनी मनकामना डिहिँडाँडा गैराफाट सिमस्वारा वौडेईचौर सडक	५५३१४१३८३।३६	११।५४९	४७८९५१७५।६३
४	काभ्रेडाडा जल्किनी घुम्ति चीसाखोला भैरवस्थान सडक	५३२९२४३०५।३४	१२।२१९	४३६१४३९६।०५
५	नेपानेडाडा सितल चौतारी भगवति चोक गालुङ कैया पाखाबाटो भोलुङ्गेपुल भुरपुरा करिडोर गालुङ्ग अर्महा सडक	२४४८३४१८३।८३	६।३६०	३८४७७७९०।९५
६	उपल्लाचौर ओडारचौर ढोडेनि सडक	११५५७०७६९।२५	२।९९६	३८५७५०२३।११
७	गलुवा भकुण्डे रायडाडा सडक	६६६२३५४१९।८८	१५।९८५	४१६७८७८।६१
८	बास्कोट लामिचौर बौडेचौर सडक	२१४१४६४६१।०९	५।२८९	४०४८९०२६।४९
९	कोठिखोला चनौटे सानोगोठ सडक	११२२१६७१।२१	२।८२२	३९७६४९५९।३२
१०	भलाटाकुरा ढिकिचौर तिनतले सडक	३९८७७५२३०।९६	१०।५७१	३७७२३५१०।६४
११	पागजा बास्कोट पैयुपाटा अमलाचौर सडक	३९५९१२७३।९५	११।५२०	३४३६७४२४।७४
	<b>जम्मा</b>		९५।२९१ कि.मी	



# कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्थापन तर्फको विवरण



- ✓ हालसम्म स्वीकृत ऐन कानूनहरुको जम्मा संख्या : ३५
- ✓ नगर सभावाट स्वीकृत विभिन्न ऐन संख्या : १५
- ✓ नगर कार्यपालिकावाट स्वीकृत नियमावली संख्या : ३
- ✓ नगर कार्यपालिकावाट स्वीकृत निर्देशिका संख्या : २
- ✓ नगर कार्यपालिकावाट स्वीकृत कार्यविधि संख्या : १५



# सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम तर्फ



➤ शुरु विनियोजन रु.	१५,००,००,०००।
➤ निकासा रु.	१२,००,००,०००।
➤ कुल खर्च रु.	१०,९६,६४,४००।
➤ फिर्ता रु.	१,०३,३५,६००।

# सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने लाभग्राहिहरुको विवरण २०७५/७६



वडा कार्यालय	ज्येष्ठ अन्य	ज्येष्ठ दलित	एकल महिला	विदुवा	पूर्ण अपाङ्गता	आसिक अपाङ्गता	दलित बालबालिका	जम्मा
१	७७	६६	१०	७१	४	१४	६१	३०३
२	१०४	४३	३२	६६	५	८	२९	२८७
३	२७६	१३२	९५	१६८	१८	२८	१३२	८४९
४	१६५	२३	४५	५७	४	२६	२७	३४७
५	१४७	४६	०	१०५	९	११	७६	३९४
६	१३९	८३	३१	१११	१५	२३	८५	४८७
७	१७४	२२७	३६	१७४	२०	२८	१८४	८४३
८	१६८	८१	०	१९०	९	१९	८७	५५४
९	१९८	५६	१	२१३	१३	३५	८४	६००
१०	३२९	८३	१	१८०	१५	१९	६४	६९१
११	१४८	६९	३	९८	१३	१३	८०	४२४
१२	३१५	७४	१७३	७०	१४	३२	२०४	८८२
१३	४०१	५७	१	२९८	२२	४७	२२९	१०५५
१४	२६८	३१	२४	११७	१३	२०	९४	५६७
जम्मा	२९१०	१०७१	४५२	१९७०	१७४	३२३	१४३१	८३३१











# बागलुङ नगरपालिकाबाट भएका मुख्य मुख्य कार्यहरूको विवरण



## उल्लेखनीय कार्यहरु २०७५।०७६

- ❖ नगर विकास कोषको ऋण तथा अनुदान सहयोगमा आधुनिक वसपार्क निर्माण कार्य भैरहेको
- ❖ सिटिहल निर्माणको प्रयास भैरहेको
- ❖ माझी वस्ती पुनस्थापनको कार्य भएको
- ❖ नगरको पूर्वाधार विकासका लागि डि.पी.आर तयारी कार्य भएको
- ❖ विद्यालय सुधार आयोजना
- ❖ Zoological Park निर्माणको प्रयास भैरहेको



# उल्लेखनीय कार्यहरु क्रमशः

- ❖ सडक मापदण्ड र भुकम्प प्रतिरोधी घर निर्माण कार्यलाई उच्च प्राथमिकता ।
- ❖ भुकम्प प्रतिरोधात्मक घर र मापदण्ड सम्बन्धी तालिम दिइएको ।
- ❖ नगरको विकासमा महत्व राख्ने विभिन्न १० वटा सडकहरु र खानेपानी योजनाहरुको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (DPR) तयार गरि (आयोजना बैंक) सोहि अनुसार कार्य गरिएको ।
- ❖ विभिन्न समितिहरुको गठन भै कार्यन्वयनमा रहेका
  १. सार्वजनिक सेवा प्रवाह तथा क्षमता विकास समिति
  २. पुर्वाधार विकास समिति
  ३. आर्थिक विकास समिति
  ४. सामाजिक विकास समिति
  ५. विधेयक समिति
  ६. वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन समिति
  ७. सभासन तथा विज्ञ व्यवस्थापन समिति



## बागलुङ नगरपालिकाबाट भए गरेका उल्लेखनिय कार्यहरु

८. न्यायिक समिति
९. राजश्व परामर्श समिति
१०. अनुगमन समिति
११. विपद् व्यवस्थापन समिति
१२. बजार अनुगमन समिति

- ❖ वडा नं १ वांगेचौरदेखि कुश्मा न.पा. पाड जोड्ने आकासे पुल निर्माण कार्यको थालनी
- ❖ बागलुङ विमानस्थल संचालनको पहल
- ❖ बागलुङ बजारमा ढल व्यवस्थापनको कार्य भैरहेको
- ❖ कृषि उपज संकलन तथा विक्री केन्द्रको स्थापनाको तयारी भैरहेको



## बागलुङ नगरपालिकाबाट भए गरेका उल्लेखनिय कार्यहरु

- ❖ पर्यटन प्रवर्धनका कार्यहरु अगाडी बढाईएको
- ❖ नगर कार्यपालिकाको कार्यलय बजार क्षेत्रमा स्थानान्तरण गरिएको
- ❖ विभिन्न ३५ वटा कानूनहरुको निर्माण भएको
- ❖ स्थानिय राजपत्रको प्रकाशन
- ❖ भुकम्प पुननिर्माण सम्बन्धि कार्य भैरहेको
- ❖ जनस्वास्थ्य सम्बन्धि प्रवर्धनात्मक कार्यहरु भैरहेको
- ❖ कृषि तथा पशु बिकास सम्बन्धि प्रवर्धनात्मक कार्यहरु भैरहेको
- ❖ उधोगग्राम स्थापनाकोलागि प्रयास भैरहेको



# नगरका मुख्य मुख्य समस्या तथा चुनौतीहरू

- ❖ स्थानीय विकासको आवश्यकता अनुसार आर्थिक श्रोत साधनको अप्रयाप्तता रहेको ।
- ❖ ग्रामीण क्षेत्रमा स्वच्छ सफा र पर्याप्त खानेपानीको अभाव ।
- ❖ नगर भित्रका ग्रामीण वस्तीमा रेखाकनन गरिएका सडकहरूको स्तरोन्नती गर्न नसकिएको ।
- ❖ वधशाला निर्माण गरी नगरवासीलाई स्वच्छ मासु उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन नसकिएको ।
- ❖ अधुरो कभर्डहल निर्माणलाई पुरा गर्ने र मौजुदा खेल मैदान लाई व्यवस्थित गर्न नसकिएको ।



## नगरका मुख्य मुख्य समस्या तथा चुनौतीहरु क्रमशः

- ❖ केन्द्रीय कार्यक्रममा स्थानीय लागत सहभागिताको अंश बढी भै योजना कार्यान्वयन गर्न कठिनाई भएको ।
- ❖ फोहरमैला व्यवस्थापन क्रमशः वोभीलो वन्दै गएको ।
- ❖ जग्गा अभावले सवारी पार्कीङको व्यवस्था गर्न नसकिएको।
- ❖ सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण वढ्दै गएको



## नगर विकासको आगामी कार्यदिशा

- ❖ नगर विकासको गुरु योजना निर्माण गरी सोहि बमोजिम कार्य गर्दै जाने ।
- ❖ बागलुङलाई पर्यटकिय गन्तव्य स्थलको रूपमा बिकसित गर्ने प्रयास भैरहेको
- ❖ सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैकिङ्ग प्रणालीमार्फत वितरण गरिने
- ❖ सहरी शासकिय सुधार तथा विकास आयोजना-२ लागू गर्ने प्रयास भैरहेको
- ❖ फोहोर मैला व्यवस्थापनकालागि वैकल्पिक उर्जा प्रवर्धन केन्द्रसंग सहकार्य भैरहेको



जिज्ञासा ?

---

# धन्यवाद

---
